




SUMARIO DE OPERACIONES

OPERACIONES CON TORRES: Oct/21/2019 06:00 am - Oct/22/2019 06:00 am

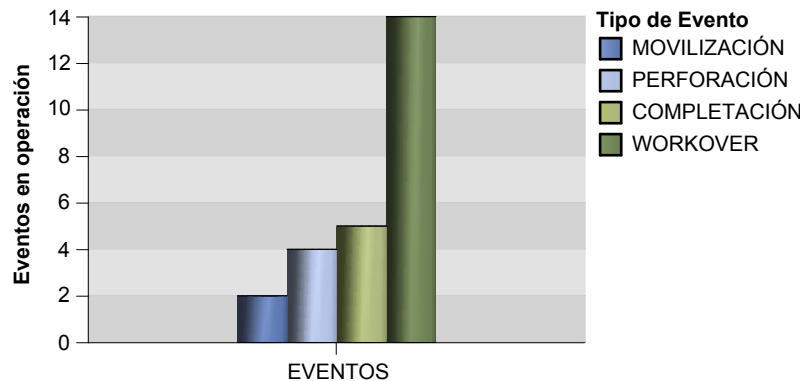

EN PERFORACIÓN

TALADRO	POZO	NOMBRE POZO	MD	TVD	DETALLE
SINOPEC 185	OSOI-153	OSO-1153	2,760	2,718.39	PERFORÓ ROTANDO Y DESLIZANDO SECCIÓN DE 16" CON BHA # 03 DIRECCIONAL CON BROCA PDC DE 16", TIPO CF519, JETS (1/32 IN): 4X12 + 4X13, TFA: 0.960 DESDE 1185 FT HASTA 2760 FT, TOMANDO Y REGISTRANDO GYRO.
SINOPEC 183	LMNG-050H	LIMONCOCHA-G050H	6,183	5,274.08	PERFORA SECCIÓN DE 16" CON BHA DIRECCIONAL No. 5 Y BROCA PDC ROTANDO Y DESLIZANDO DESDE 4396 FT HASTA 5525 FT + BOMBEA PÍLDORAS DE LIMPIEZA Y CIRCULA + CONTINÚA PERFORANDO SECCIÓN DE 16" DESDE 5525 FT HASTA 6183 FT
CCDC-036	TMBB-066H	TAMBOCOCHA-B066H	6,000	4,626.48	ARMA Y BAJA BHA DIRECCIONAL #2 CON BROCA PDC 12-1/4" Y GEOPILOT HASTA TOPE DE TAPONES + REALIZA DRILL OUT Y PERFORA 10' FORMACIÓN + CAMBIA FLUIDO + FIT + PERFORA SECCIÓN 12-1/4" SEGÚN PROGRAMA HASTA 6000 FT
CCDC-066	TMBE-065H	TAMBOCOCHA-E065H	6,248	4,774.44	CIRCULA +SACA BHA#2 A 5214 FT+CIRCULA +SACA BHA#2 A SUPERFICIE +QUIEBRA BHA#2 + REALIZAR CORRIDA DE CSG DE 9 5/8 HASTA 6248 FT(TD) + ESTABILIZA PARAMETROS DE CAUDAL Y CEMENTACION + RIGDOWN DE EQUIPOS+ ARMA Y BAJA WASHING TOOL.

EN COMPLETACIÓN

TALADRO	POZO	NOMBRE POZO	No	DETALLE
CCDC-069	PRHG-027	PARAHUACU-G027	COM	CONTINUA, CORRIENDO EN POZO EL BHA #2 HIDRÁULICO, PARA EVALUACIÓN DE PRODUCCION DE LA ARENA U INF, INTERVALO 10420 A 10430 FT, SERTECPET, ASIENTA EL PAKER 7" X 2 7/8" MECÁNICO RTM A 10361,51 FT DYGOIL SLICK LINE ABRE SS 10291,48 FT, ASIENTA BOMBA A LA MISMA
SINOPEC 168	YCCA-017	YURALPA CENTRO CHONTA-A017	COM	INICIO OPERACIONES DE COMPLETACION DE POZO YCCA-017, RECUPERO WEAR BUSHING + BAJO TEST PLUG, REALIZO PRUEBA DE BOP. ARMO Y BAJO BHA # 1 DE LIMPIEZA EN TANDEM HASTA 8095 FT. REALIZA CAMBIO DE FLUIDO POR FLUIDO DE CONTROL 8.8 LPG. SACA BHA # 1 HASTA 250 FT
SINOPEC 219	CYBC-056	CUYABENO-C056	COM	ARMO EQUIPO BES SUPERIOR, LEVANTO Y ARMO HANDLING SUB, ACOPLA BY-PASS, TIW ARMA HERRAMIENTAS PARA TUBERÍA 5 1/2", CONECTA CAPILAR 3/8", BAJA EQUIPO DOBLE CONCÉNTRICA EN CASING 5 1/2" BTC, CAMBIA DE CARRETO Y REALIZA EMPALME DE CABLE EQUIPO INFERIOR.
SINOPEC 907	ARMB-012I	ARMADILLO-	COM	CORRIO PACKER VTA EN CSG 9 5/8" 10908 FT, REGISTRO



SUMARIO DE OPERACIONES

OPERACIONES CON TORRES: Oct/21/2019 06:00 am - Oct/22/2019 06:00 am

TALADRO	POZO	NOMBRE POZO	No	DETALLE
		B012I		PESOS DE SARTA, CORRIO PACKER VTA EN CASING 7" EN 3-1/2" IF D.P SUBIENDO TUBO X TUBO DESDE LOS CABALLETES HASTA 13276 FT (CENTRO EMPACADURAS 13262.43) , ASENTO PACKER, SACA BHA #8 QUEBRANDO DRILL PIPE.
SLR-401	CLBC-042H	CULEBRA-C042H	COM	DESARMAN ENSAMBLE DE MODULO NPS Y SERVICE TOOL, QUIEBRAN WASH PIPE, STINGER EN BUENAS CONDICIONES, BAJAN ACCESORIOS DE TIW. QUIEBRAN EXCESO DE TUBERIA DE TRABAJO DESDE LA TORRE. CORREN REGISTRO MICRO DOGLEG CON GYRO DATA, DESDE 8,500FT HASTA 10,660FT.

EN MOVILIZACIÓN

TALADRO	POZO	NOMBRE POZO	No	DETALLE
SINOPEC 127	YNEA-010	YANAQUINCHA ESTE-A010	MOV	RDS, DESINSTALA MINI CAMP + DESCONECTA GENERADORES Y TANQUES DE DIESEL, MUEVE MINI CAMP EN YNEA INSTALA MINI CAMP + LINEAS ELECTRICAS Y DE AGUA + CAÑERIAS. INSTALA GENERADORES Y TANQUES DE DIESEL TOTAL DE CARGAS HOY 27. RD 70%, RM 45% RU 15%
TUSCANY-119	SNSE-021	SANSAHUARI-E021	MOV	REUNION DE SEGURIDAD + REALIZA MONTAJE DE LA TORRE EN LA ESTRUCTURA + ENHEBRA CABLE DE PERFORACIÓN + DESARMA, MOVILIZA Y ARMA CASETA DE QUIMICOS - EQUIPO DE CONTROL DE SÓLIDOS

EN WORKOVER

TALADRO	POZO	NOMBRE POZO	No	DETALLE
CSSFD-01	SHST-233	SHUSHUFINDI-T233	03	ARMA EQUIPO BES SUPERIOR RC1000 Y ACOPLA CONJUNTAMENTE AL BY PASS TBG 2 7/8". SUBE POLEA EQUIPO SUPERIOR Y CUELGA EN LA TORRE. ARMA TERCERA SECCION DE COMPLETACION DUAL.
ELEFANTE AZUL 01	TPTA-047	TIPUTINI-A047	01	MOVILIZA VIA FLUVIAL HACIA EL BLOQUE 43 TOTAL 16 CARGAS DEL EQUIPO ELEFANTE AZUL 01 DE CIA. LOXODONTA. DESEMBARCA TODAS LAS CARGAS EN PUERTO SAN CARLOS. MOVILIZA 3 CARGAS HASTA EL POZO TPTA 047.
GEPETSA-03	PCN-022	PUCUNA-022	02	CIRCULO CSG-TBG PARA RECUPERAR ARENA DE FRACTURA AL CATCH TANK HASTA RETORNOS LIMPIOS + SACA UNA PARADA EXTRA HACIA EL MASTIL. ESPERA POR TIEMPO DE CONSOLIDACION DE EXPEDITE
GEPETSA-04	ACAH-093	AUCA-H093	03	REALIZO PRUEBA DE HERMETICIDA A SECCION C DEL CABEZAL Y BAYONETA. BAJO TORRE. INSTALO INSTRUMENTACION. REALIZO PRUEBA DE GIRO. INICIO EVALUACION DE PRODUCCION A LAS 09:00 HRS AL TANQUE DE CRUDO DEL RIG. ALINEO A LA ESTACION DE PAM
GEPETSA-05	LGA-035	LAGO AGRIO-035	15	
GEPETSA-06	ACAF-088	AUCA-F088	05	PRUEBAN BOP Y ACUMULADOR. LEVANTAN SARTA Y DESCONECTAN TUBING HANGER. ARMAN EQUIPO DE WIRE LINE Y REALIZAN TUBING PUNCH DESDE 9243' HASTA 9244'. SACAN EQUIPO ELECTROSUMERGIBLE RC-1000 EN 3-1/2" TUBERIA EUE EN SENCILLOS A LOS CABALLETES
SAXON 47	ACAC-165	AUCA-C165	02	LLENA ANULAR, LIMPIA DESDE 11533 HASTA 11630 FT, DESPLAZA TREN DE PILDORAS ANTIPERDIDA, SACA BHA DE LIMPIEZA POR ENCIMA DE TOL Y ESPERA DECANTACION, VERIFICA FONDO OPERATIVO A 11628 FT, CAMBIA CON FLUIDO DE CONTROL DE 8.5 PPG
SAXON-55	YCA-006	YUCA-006	07	



SUMARIO DE OPERACIONES

OPERACIONES CON TORRES: Oct/21/2019 06:00 am - Oct/22/2019 06:00 am

TALADRO	POZO	NOMBRE POZO	No	DETALLE
SAXON-56	ACAG-191	AUCA-G191	01	MOVILIZO REPUESTOS, REALIZO REEMPLAZO DE REPUESTOS EN TRANSMISION DEL CARRIER. SACO BHA DE CEMENTACION EN 3-1/2" DP EN PARADAS. DESARMO BHA PKR SALIO EN BUEN ESTADO. ARMO DE BHA DE CEMENTO #2 CON Flexpac Packer 7" 29#.
SINOPEC 932	EDYD-063	EDEN YUTURI-D063	03	SACAN EQUIPO BES SN3600 CON Y-TOOL EN TBG 4-1/2" SEC QUEBRANDO, REALIZAN CAMBIO DE CARRETO, SACA EQUIPO BES SN3600 CON Y-TOOL HASTA SUPERFICIE. DESARMA BHA DE PRODUCCIÓN Y Y-TOOL, DESARMAN EQUIPO BES SN3600 92 STG
TRIBOILGAS-101	SCH-052B	SACHA-052B	05	RETIRA CABEZAL, INSTALA SUBESTRUCTURA, ARMA CONJUNTO BOP, LEVANTA Y RETIRA TBG HANGER, SUBE POLEA CIA. 4L, SACA EQUIPO BES D105N EN 3-1/2" EUE TBG POR PARADAS A LA TORRE, DESARMA BHA DE PRODUCCION, DESARMA EQUIPO BES.
TRIBOILGAS-102	SCHAO-471	SACHA-AO471	02	BAJA EQUIPO BES CON 3 BOMBAS SF2700 DE HALLIBURTON EN 3-1/2" EUE TBG (RE-RUN) EN PARADAS, HASTA 5073' PUNTA DE CENTRALIZADOR. CAMBIA DE PRIMER A SEGUNDO CARRETO. REALIZA EMPALME.
TUSCANY 104	SCY-033B	SECOYA-033B	07	DESARMA CONJUNTO TCP, OK. ARMA, BAJA 7" RBP EN 3 1/2" IF DRILL PIPE. ASIENTA A 1550 FT. SACA DRILL PIPE EN PARADAS. RETIRA BOP, CAMBIA SECCION "B" DEL CABEZAL.
TUSCANY 111	ACAO-037	AUCA-O037	05	WIRELINE CORRELACIONA PROFUNDIDAD DE MARCA RADIOACTIVA, DESARMA UNIDAD DE WIRELINE. SACA BHA # 3 MOLEDOR CON 3 1/2" DP EN PARADAS, ARMA BHA # 4 DE LIMPIEZA/CALIBRACIÓN

* Pozos con eventos abierto

TALADRO	POZO	NOMBRE POZO	EVENTOS	ÚLTIMO REPORTE
SINOPEC 168	YCCA-017	YURALPA CENTRO CHONTA-A017	PERFORACIÓN	10/21/19
